



MONTAGEANVISNING BADRUMSMODUL

VP-X20/20S

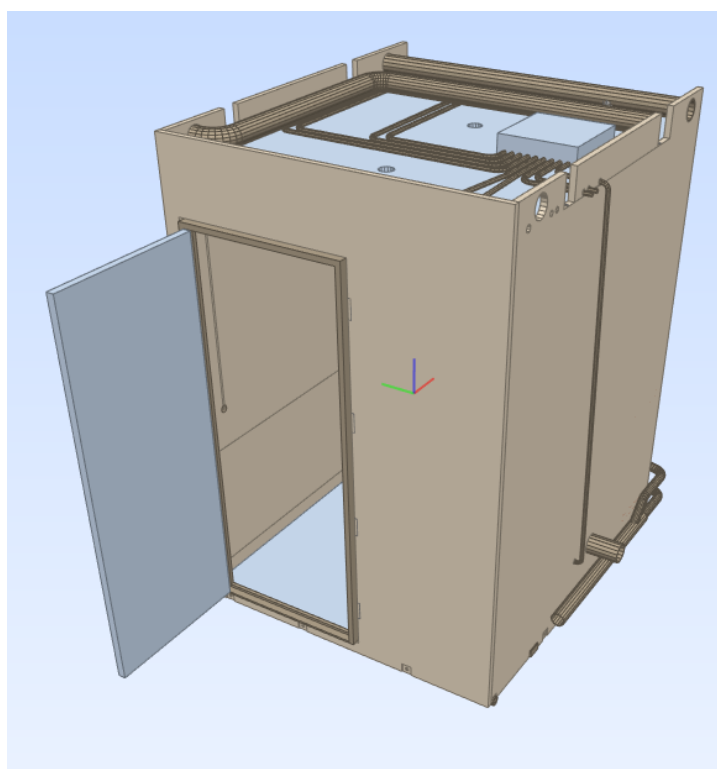

INNEHÅLL


LASTSÄKRING OCH LYFT.....	sid 3
PALLNING.....	sid 4
MONTAGE.....	sid 5
INSLATLLATON.....	sid 5
ÖVRIG INFO.....	sid 6

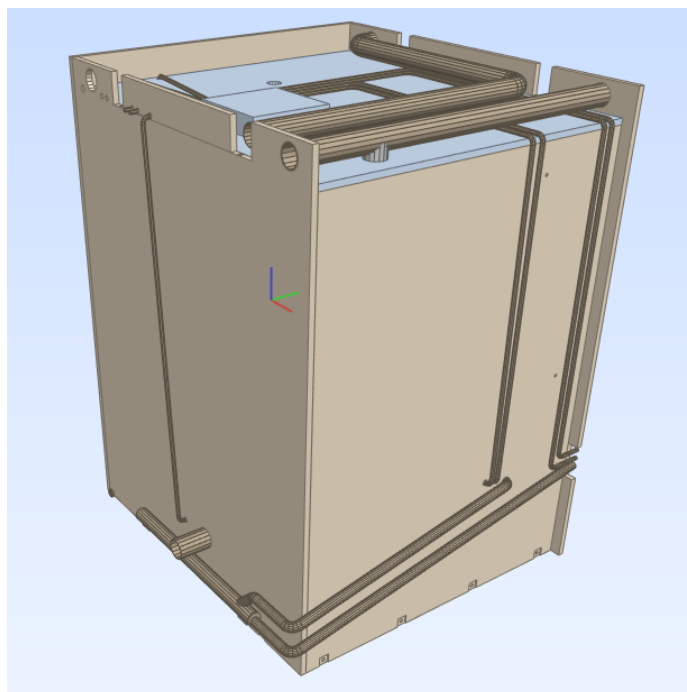


LASTSÄKRING OCH LYFT

Demontera spännband och lastsäkringsbeslagen som sitter monterade i modulens lyft, M12-bult. (lastsäkringsbeslagen kommer framledes att utgå pga ändrad lastsäkring)

Montera sedan ledat vajerlyft 4st M12 (1,3T).



CE

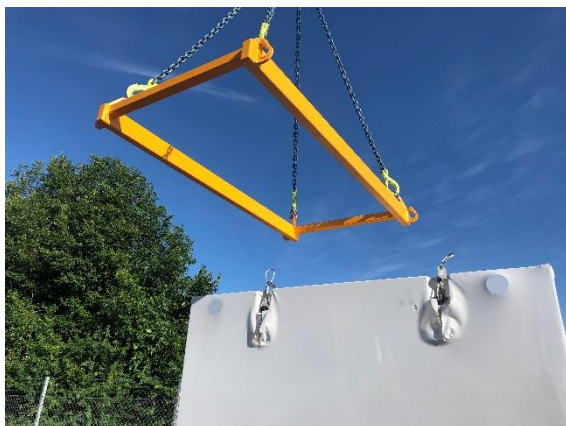

Använd Lyftok för Modul VP-X20 (kan hyras av V-Prefab). Koppla modulen i de 4st vajerlyften till lyft-oket.

Lyftoket kopplas i sin tur med 4-partskätting.

Medföljande säkerhetssling 8m skall användas. 2st bandstroppar läggs i sling runt modulen och kopplas till 4-partskätting. Avlägsnas när modulen är på våningsplan innan slutjustering av modul.

Modulens vikt är ca 2500kg.

Tejpa igen plasten för att undvika fuktskador när modulen är monterad och wirelyften är demonterade.




Beslagen returneras tillbaka med transportör till Veidekke Prefab AB i Sala.


PALLNING

Modulens tjocklek på golv är 70mm inkl. klinker. Golvbrunnen sticker ner ca 25mm under modul.

Modulen pallas vid punkterna enligt bilden nedan med shims/stålbrickor samt ev neopren (ingår ej i leverans).

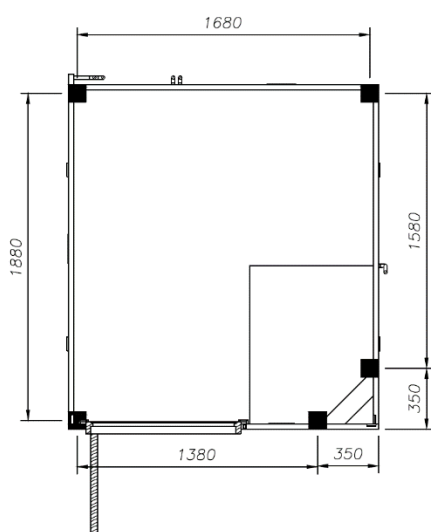

Måttförslag med pallningsbrickor 100x100mm

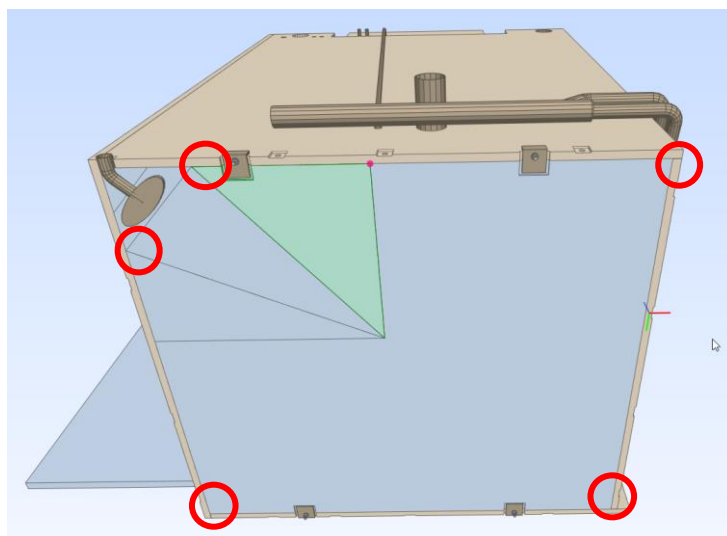

Observera att pallning ej sker på golvbrunnen. Palla till önskad höjd. Väg in pallning i våg (ev överpallning om sättning i bjälklaget riskeras) på bjälklaget innan modulen monteras. Neoprendynorna kan användas för att ta upp små ojämnheter i betongen samt att ta bort stegljud.

Modulens utvändiga höjd är 2 550mm + 25mm utstick på golvbrunn.

Ovanstående pallning sker även vid ev mellanlagring.

MONTAGE

Montera modulen på den invägda pallningen.

Iakttag försiktighet så att inte rör och kablar skadas vid montaget.

När modulen står på plats och är invägd så rekommenderas kontroll av golvets fall mot golvbrunn inne i modul (kontroll så att den inte är invägd i bakfall). Se till att plasten vid dörren återsluts efter att detta är gjort. Beställaren ansvarar så att tillträde i modulen ej sker efter invägning. Tejpa även igen plast vid lyft så att vatten ej rinner in på taket.

Plasten skall sedan behållas intakt tills byggnaden har tätt tak.

Gå ej på modulens tak. Installationer kan skadas.

INSTALLATION

VVS

Modulen levereras med ett fördelarskåp för tappvattnet, som sitter monterat på taket.

Rörsystemet i badrumsmodulen är av typ LK Systems.

Från fördelarskåpet så finns föranslutna slangar RiR LK PE-X dim16. för Vv och Kv till kök och stammar.

Se "Monteringsanvisningar LK PE-X, PAL och PE-RT rör" www.lksystems.se

VENT

Utstick till frånluft och tilluft enligt beställarens anvisningar. Dim 100mm.

EL

El till badrummet är installerat och klart.

Modulen levereras med kopplingsboxar placerade enligt beställarens anvisning för inkoppling av el till badrumsmodul.

ÖVRIG INFO

- Inträde efter invägning skall ej ske utan överenskommelse med V-Prefab.
- OBS! Modulens väggar är 30mm tjocka + kakel. Max 20mm borrhjup för infästning från utsida. Vi rekommenderar att inga utvändiga infästningar görs.
- Infästningar på insidan i badrumsmodulen skall ske enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum.
- Lastsäkringsbeslagen skall returneras löpande efter lossning av moduler.
- Lyftok returneras efter avslutat montage till Veidekke Prefab i Sala.
