


MONTAGEANVISNING BADRUMSMODUL


VP-X12 VP-X15 VP-X17

Projekt Branddörren L4, L5

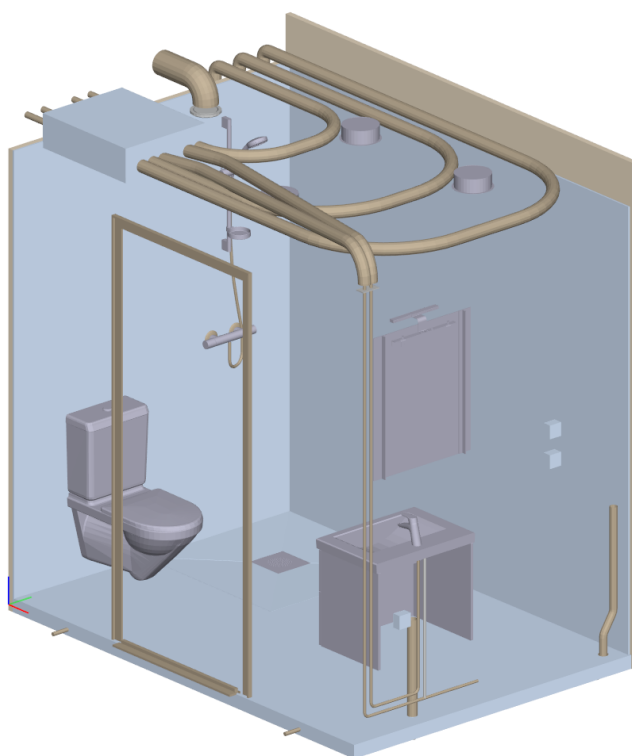

INNEHÅLL

URSPARNING I BJÄLKLAG.....	sid 3
LYFT AV MODUL.....	sid 4
INSTALLATION.....	sid 6
ÖVRIG INFO.....	sid 7

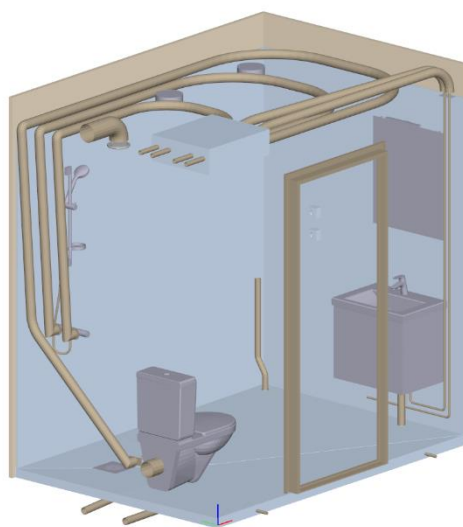

URSPARNING I BJÄLKLAG

Modulens tjocklek på golv är 70mm inkl klinker.

Ursparning för avlopp och golvbrunn enligt tidigare lämnat underlag till projektet för respektive modultyp. Ursparning för avloppen måste vara minst 105mm djup.

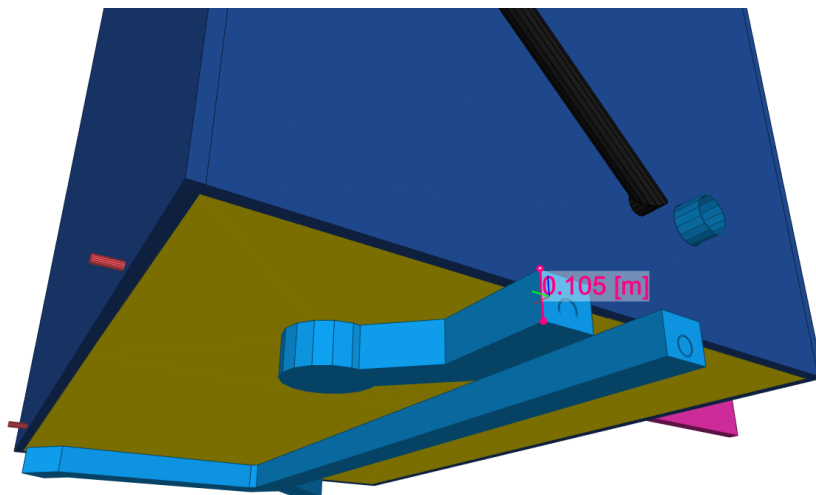


Illustration visar lämplig ursparning under modul för avlopp som görs i bjälklag.

Modulen pallas med shims/stålbrickor samt neopren under modulens 4 hörn, till önskad höjd (ingår ej i leverans). Dessa vägs in i våg (ev överpallning om sättning i bjälklaget riskeras) på bjälklaget innan modulen monteras. Neoprendynorna är till för att ta upp små ojämnheter i betongen samt att ta bort stegljud.

Modulens utvändiga höjd är 2 555mm.



Avlopp under modul

LYFT AV MODUL

Lyft får endast ske med kran och med Veidekke Prefabs lyftok för badrumsmoduler.

1. Justera kättingarna till rätt håll för den modultyp som ska lyftas. Hålen på oket är märkta med respektive modultyp där kättingarna skall sitta.
Se bild nedan.



2. Skruva loss muttern på gängstången på modulen. Trä på lyftet och återmontera muttern. **DRA ÅT!**



3. När alla 4 lyft är monterade kan lyftet påbörjas.

OBS! Kontrollera så att kättingarna inte klämmer mot modulens väggar i överkant eller mot slangar eller utrustning under plasten. Om det klämmer för hårt så flytta ut kättingarna ett hack till på oket.



Lyft av VP-X12/12s



Lyft av VP-X15/15s



Lyft av VP-X17/17s

MONTAGE

Montera modulen på den invägda pallningen.

Iakttag försiktighet så att inte rör och kablar skadas vid montaget.

När modulen står på plats och är invägd så rekommenderas kontroll av golvets fall mot golvbrunn inne i modul. Se till att plasten vid dörren återsluts efter att detta är gjort. Beställaren ansvarar så att tillträde i modulen ej sker efter invägning.

Plasten skall sedan behållas intakt tills byggnaden har tätt tak.

Gå ej på modulens tak. Installationer kan skadas.

INSTALLATION

VVS

Modulen levereras med ett fördelarskåp för tappvattnet, som sitter monterat på taket. Rörsystemet i badrumsmodulen är av typ LK Systems.

Från fördelarskåpet så finns föranslutna sling för Vv och Kv till kök och ev extra WC.

Installation ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation.

Avloppsutstick från WC (110mm), golvbrunn, tvättställ och tvättmaskin (dim50mm) finns mot modulens schaktsida.



Avloppsanslutningar



Fördelarskåp


VENT

Utstick till frånluft enligt beställarens anvisningar. Dim125mm.

OBS. På frånluft på VP-X12 och VP-X12s på projekt Branddörren så kommer rör sluta strax innanför tak (dvs ej utstick). Detta är pga att lyftkätting ej ska klämma röret.

EL

El till badrummet är installerat och klart. Modulen levereras med kopplingsboxar placerade enligt beställarens anvisning för inkoppling av el till badrumsmodul.

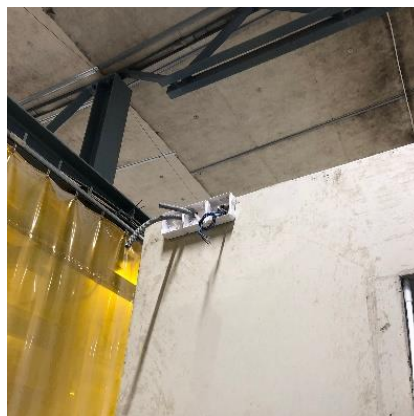

El-anslutningar

EL-sling till TM och TT på VP-X17/17s



Schaktsida VP-X12



Tak VP-X12



Tak VP-X17



Tak VP-X15s



Schaktsida VP-X15s

ÖVRIG INFO

- Inträde skall ej ske i modulen (*förutom kontroll av fall*) innan gemensam försyn. Detta sker efter att byggnaden har tätt tak.
- Plasten som sitter över taket är godkänd för att byggas in. Isolering (lamellmatta) sitter monterad på frånluftskanalen som distanser så att plasten ej lägger sig direkt mot kanalen.
- OBS! Modulens väggar är 30mm tjocka + kakel. Max 20mm borrhjup för infästning från utsida. Vi rekommenderar att inga utvändiga infästningar görs.
- Infästningar på insidan i badrumsmodulen är ej tillåten utan samråd med Veidekke Prefab. Vid inverkan på tätskiktet så gäller ej garantin.
- Lyftok returneras efter avslutat montage till Veidekke Prefab i Sala.
